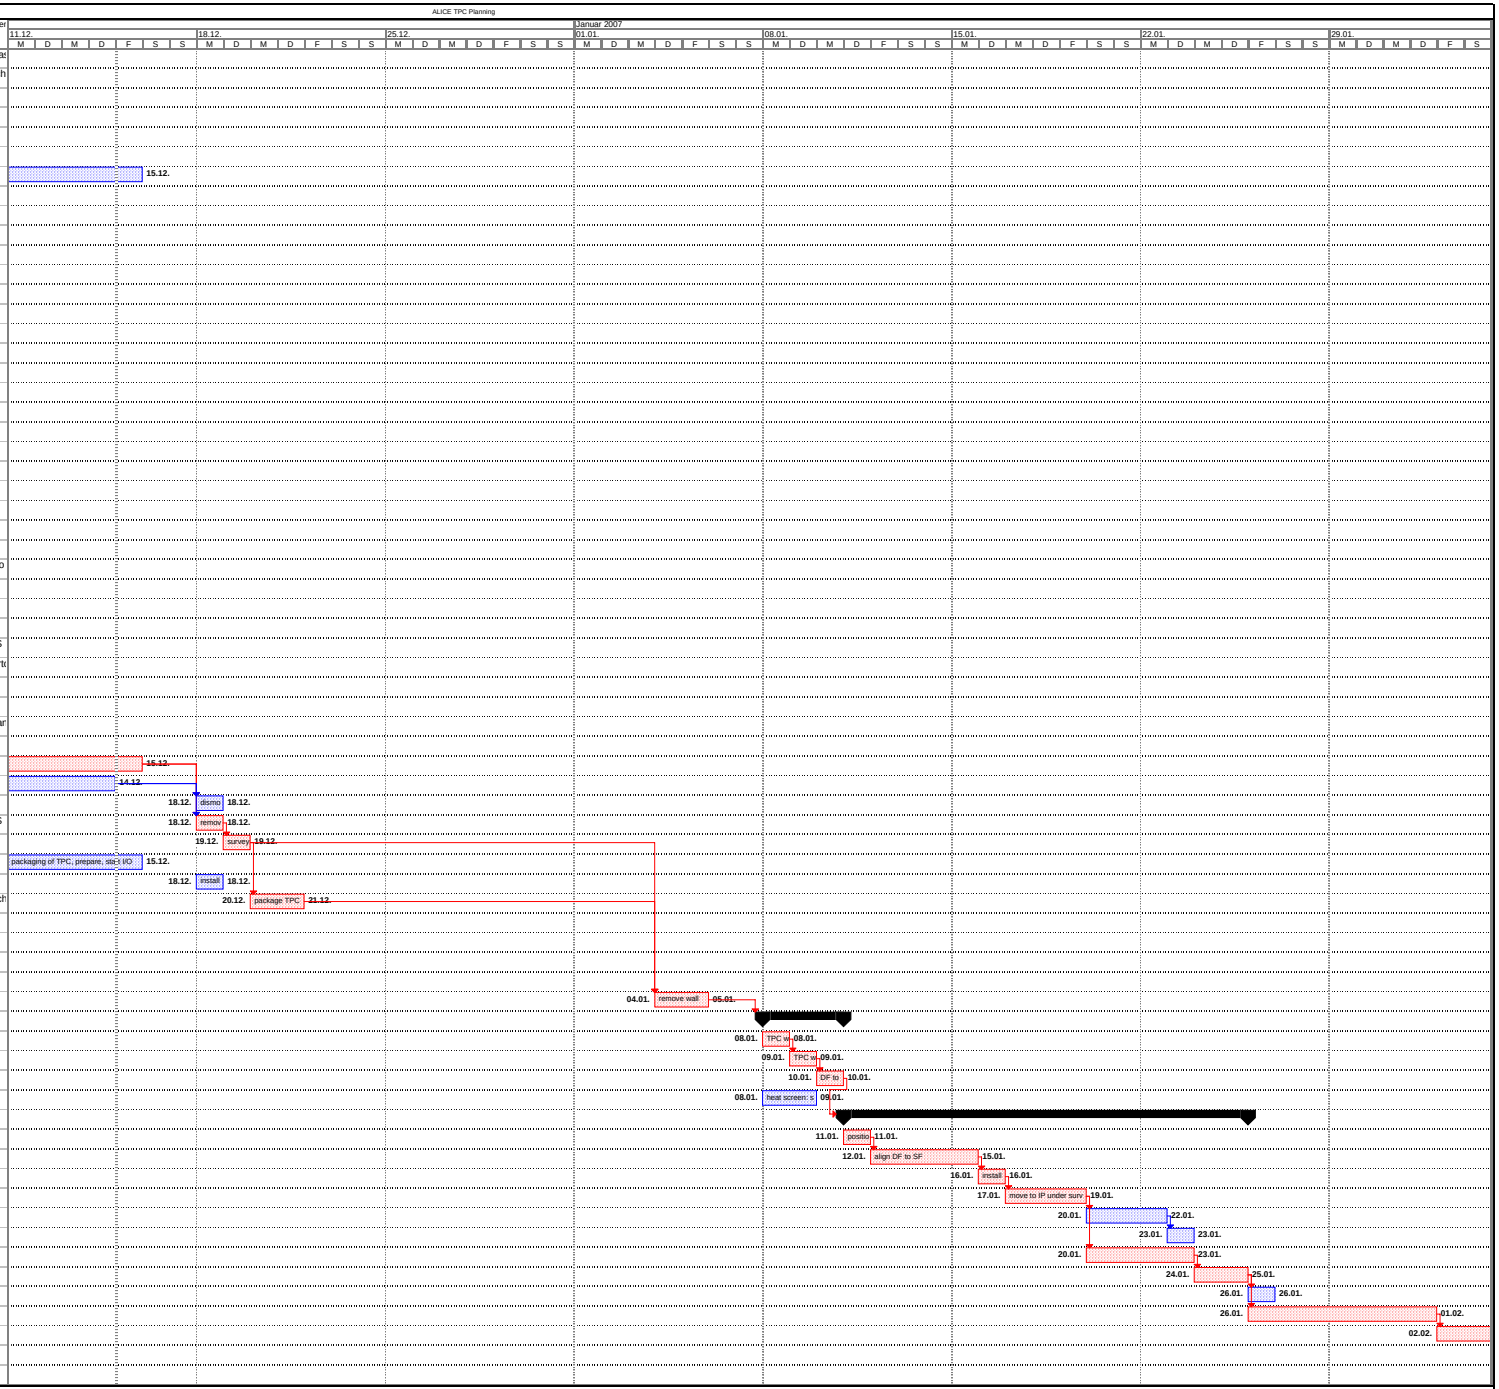Nr.	Vorgangsname	Anfang	Dauer	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	completion of heat screen in SF	Do 16.11.06	15 Tage	Mo 04.12.06		Daniel;Thomas
2	C-side commissioning phase 2	Mo 30.10.06	21 Tage	So 19.11.06		Luciano;Joach
3	remove VHV cable	Mo 20.11.06	1 Tag	Mo 20.11.06	2	Joachim
4	disconnect services C-side, finalize covers	Mo 20.11.06	5 Tage	Fr 24.11.06	2	Bergen
5	water manifold inner heat screen C-side	Do 30.11.06	2 Tage	Fr 01.12.06	4	Peter;tc
6	leak test manifold C-side	Mo 04.12.06	1 Tag	Mo 04.12.06	5	Peter
7	**more work on C-side: cabling, hoses ...**	Mo 04.12.06	10 Tage	Fr 15.12.06	5	Rainer, Rudi
8	water manifold inner heat screen A-side	Di 05.12.06	2 Tage	Mi 06.12.06	33;6	Chilo;tc
9	leak test water manifold A-side	Do 07.12.06	1 Tag	Do 07.12.06	8	Thomas
10	purge TPC with air	Mo 20.11.06	3 Tage	Mi 22.11.06		Chilo
11	fix CO2 bottle to DF	Di 07.11.06	2 Tage	Mi 08.11.06		Chilo
12	MT ready	Di 31.10.06	1 Tag	Di 31.10.06		JC
13	remove A00 FEE	Mi 01.11.06	1 Tag	Mi 01.11.06	12	Antoine
14	remove FEE frame	Do 02.11.06	1 Tag	Do 02.11.06	13	Uli;Rudi
15	remove A00 pt1000	Mi 08.11.06	1 Tag	Mi 08.11.06	14	Rudi
16	spare OROC testing	Do 09.11.06	13 Tage	Di 21.11.06		Chilo;Rudi
17	prepare small pieces	Mi 01.11.06	5 Tage	So 05.11.06		Danilo;Uli
18	clear out clean room	Mo 06.11.06	2 Tage	Di 07.11.06		
19	cleaning	Mi 08.11.06	3 Tage	Fr 10.11.06	18	
20	prepare platform	Mo 13.11.06	4 Tage	Do 16.11.06		JC
21	remove scaffold A-side	Mi 15.11.06	1 Tag	Mi 15.11.06		JC
22	remove laser	Mi 15.11.06	1 Tag	Mi 15.11.06		Borge;DBS
23	move platform into clean room	Mo 20.11.06	1 Tag	Mo 20.11.06		JC;DBS
24	remove VHV	Mo 20.11.06	1 Tag	Mo 20.11.06		Joachim
25	complete platform, prepare tools	Di 21.11.06	2 Tage	Mi 22.11.06	23	JC;tc
26	**exchange OROC A00, shim, seal**	Do 23.11.06	1 Tag	Do 23.11.06	10;16	Uli;JC;Danilo
27	leak test	Fr 24.11.06	1 Tag	Fr 24.11.06	26	Joachim;Chilo
28	mount pt1000	Fr 24.11.06	1 Tag	Fr 24.11.06	26	Rudi;Uli
29	mount frames services	Mo 27.11.06	1 Tag	Mo 27.11.06	28	Uli;Danilo
30	mount FEE A00	Di 28.11.06	2 Tage	Mi 29.11.06	29	Antoine
31	modify platform, remove ACORDE	Do 30.11.06	1 Tag	Do 30.11.06	30	Joachim;DBS
32	move services	Fr 01.12.06	1 Tag	Fr 01.12.06	31	Rainer,Roberto
33	test FEE A00, new Wiener 2 sectors	Mo 04.12.06	1 Tag	Mo 04.12.06	32	Luciano
34	install ITS rail sections	Di 05.12.06	1 Tag	Di 05.12.06		Simonetti
35	A05, A13 FEC, test	Di 05.12.06	1 Tag	Di 05.12.06	33	Antoine;Luciano
36	A12 gating test	Mi 06.12.06	1 Tag	Mi 06.12.06	35	Danilo
37	noise studies, ground modification	Mi 06.12.06	8 Tage	Fr 15.12.06	35	Luciano
38	**A-Side: finalize covers, more work**	Fr 01.12.06	10 Tage	Do 14.12.06	31	Rainer
39	**dismount and remove yellow platform**	Mo 18.12.06	1 Tag	Mo 18.12.06	37;38	JC;DBS
40	remove scaffolds A/C except one each side	Mo 18.12.06	1 Tag	Mo 18.12.06	37;38	Joachim;DBS
41	**survey A/C**	Di 19.12.06	1 Tag	Di 19.12.06	40	Antje
42	packaging of TPC, prepare, start I/O	Mo 11.12.06	5 Tage	Fr 15.12.06		JC
43	**install ITS cameras**	Mo 18.12.06	1 Tag	Mo 18.12.06		Bjorn
44	**package TPC**	Mi 20.12.06	2 Tage	Do 21.12.06	41	Thomas;Joach
45	prepare support beams for transport	Do 30.11.06	1 Tag	Do 30.11.06		JC
46	black paint inner heat screen	Mi 29.11.06	3 Tage	Fr 01.12.06		JC
47	tension bretelles	Mi 15.11.06	1 Tag	Mi 15.11.06		Daniel
48	fix track-rods	Do 07.12.06	1 Tag	Do 07.12.06		Peter
49	remove wall	Do 04.01.07	2 Tage	Fr 05.01.07	41;44	JC;DBS
50	**TPC transport**	**Mo 08.01.07**	**3 Tage**	**Mi 10.01.07**	**49**	
51	**TPC with crane to hydraulic station**	Mo 08.01.07	1 Tag	Mo 08.01.07		
52	TPC with trailer to SX2 and UX2 shaft pos	Di 09.01.07	1 Tag	Di 09.01.07	51	
53	DF to final position	Mi 10.01.07	1 Tag	Mi 10.01.07	52	
54	heat screen: special panels for IST access	Mo 08.01.07	2 Tage	Di 09.01.07		Thomas
55	**TPC installation phase 3a**	**Do 11.01.07**	**13 Tage**	**Do 25.01.07**	**53**	
56	position on support blocks	Do 11.01.07	1 Tag	Do 11.01.07		Yannik
57	align DF to SF	Fr 12.01.07	3 Tage	Mo 15.01.07	56	Yannik;Antje
58	install transfer rails	Di 16.01.07	1 Tag	Di 16.01.07	57	Yannik
59	move to IP under survey	Mi 17.01.07	3 Tage	Fr 19.01.07	58	Antje;Yannik
60	align TPC at IP	Sa 20.01.07	2 Tage	Mo 22.01.07	59	Yannik
61	align ITS rails at absorber	Di 23.01.07	1 Tag	Di 23.01.07	60	Werner
62	install DF platform	Sa 20.01.07	3 Tage	Di 23.01.07	59	Lars
63	move TPC to parking	Mi 24.01.07	2 Tage	Do 25.01.07	62	Yannik
64	Install SF platform	Fr 26.01.07	1 Tag	Fr 26.01.07	63	
65	Install ITS table + rails	Fr 26.01.07	6 Tage	Do 01.02.07	63	
66	**contingency**	Fr 02.02.07	3 Tage	Mo 05.02.07	65	
67	ready to install Be beam pipe 7.2.	Mo 05.02.07	0 Tage	Mo 05.02.07	66	
68		Fr 01.12.06	1 Tag?	Fr 01.12.06
